


COMPLETAMENTO DEL DEPURATORE CONSORTILE DI MISTERBIANCO ED ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA

REGIONE SICILIANA

REPORT DI VERIFICA

ALLEGATO 2 - IL PERCORSO DI VERIFICA

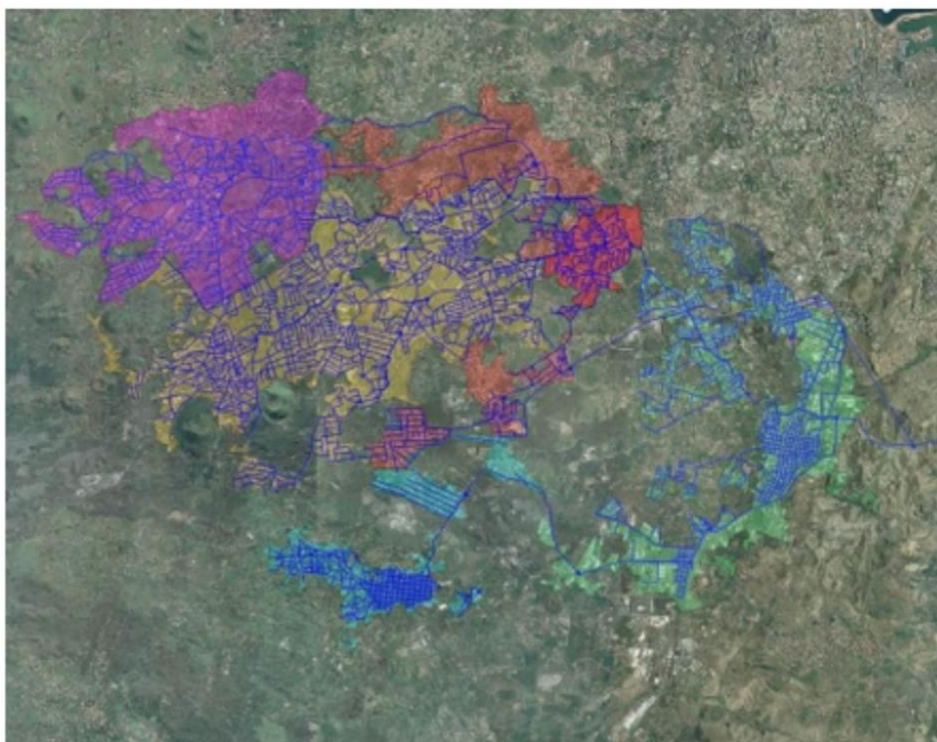

NUVEC - NUCLEO VERIFICA E CONTROLLO - AREA DI ATTIVITÀ 1
SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO PER L'ACCELERAZIONE DI
PROGRAMMI DELLA POLITICA DI COESIONE E VERIFICA DI EFFICACIA

INDICE

1.	L'AVVIO DEL PERCORSO DI VERIFICA.....	3
2.	PRIMA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA ED ESAMINATA	3
3.	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE ESAMINATA.....	3
4.	INTERVISTA AL RUP.....	3
5.	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ED ESAMINATA	3
6.	CONDIVISIONE DEGLI ESITI PRELIMINARI DELLA VERIFICA CON I SOGGETTI COINVOLTI.....	5
	ALLEGATO 2.1 – NOTA DI ACCREDITO	6
	ALLEGATO 2.2 – ESTRATTO INTERVISTA ALLA STRUTTURA COMMISSARIALE	8

1. L'avvio del percorso di verifica

Il **1^a aprile 2020** è stata inviata la nota di accredito (**allegato 2.1**) a:

- a. Regione Siciliana – Dipartimento Acqua e Rifiuti – Ing. Marcello Loira
- b. Commissario straordinario Unico per la depurazione – Prof. Enrico Rolle
- c. Regione Siciliana – Dipartimento Bilancio – Dott. Giovanni Bologna
- d. Regione Siciliana – Dipartimento Programmazione – Area 5 – FSC
- e. NUVVIP – Dott. Domenico Spampinato

Con la nota di accredito, in cui a seguito dell'emergenza sanitaria si specificava che l'analisi sarebbe stata condotta inizialmente su base documentale, sono stati richiesti i documenti disponibili ritenuti utili per un'analisi preliminare dell'intervento (a titolo di esempio, relazione descrittiva, previsione nella programmazione triennale o nell'elenco annuale dei lavori pubblici, convenzione tra soggetto titolare delle risorse e beneficiario atti di approvazione, relazione di avanzamento attuale, ecc.

2. Prima documentazione ricevuta ed esaminata

Con nota n.14909 del **15 aprile 2020** il Dipartimento Acqua e Rifiuti comunicava che l'intervento in oggetto è di competenza del Commissario Unico per la depurazione e che tutte le informazioni relative all'intervento stesso sono reperibili presso la struttura commissariale.

Con comunicazioni del **16 aprile 2020**, la struttura Commissariale, nella persona del RUP – Ing. Cecilia Corrao – ha inviato la **Relazione sullo stato di attuazione dell'intervento**.

Con successiva comunicazione **del 29 aprile 2020**, il RUP ha inviato il questionario.

3. Ulteriore documentazione esaminata

Oltre alla documentazione ricevuta il Gruppo di Lavoro ha esaminato:

- Delibera CIPE 60/2012 “Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione regionale. Assegnazione di risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche”;
- APQ “Depurazione Acque Reflue” del 30 gennaio 2013;
- DPCM del 27.4.2020 di nomina del Commissario Unico prof. Enrico Rolle;
- DPCM dell'11.5.2020 di nomina del Commissario Unico prof. Maurizio Giugni;
- Articoli di stampa.

4. Intervista al RUP

A seguito dell'esame della documentazione sopra indicata, è stata organizzata un'intervista la struttura commissariale.

L'intervista si è tenuta in videoconferenza il giorno **17 giugno 2020**: in allegato si riporta uno stralcio delle sintesi con le principali questioni affrontate e con l'elenco dei partecipanti (**allegato 2.2**).

5. Ulteriore documentazione richiesta ed esaminata

A seguito dell'intervista, sono stati richiesti ulteriori documenti per completare il quadro del Progetto.

Il **21 luglio 2020**, il RUP ha inviato la seguente documentazione:

- Esiti riunioni del Tavolo Tecnico costituito al MATTM del 21.11.2013 e del 10.1.2014 in relazione all'analisi progettuale preliminare redatta dagli 11 comuni su cui insiste l'intervento;
- Verbale della Conferenza di servizi del 4.4.2016;

- Documento di Programmazione Generale, approvato dal Commissario con Provvedimento n.13 del 4.4.2016, con le relative tavole di progetto;
- Prospetto riepilogativo del quadro dei fabbisogni dell'APQ;
- Ultimo aggiornamento della tabella di monitoraggio procedurale e finanziario, viene trasmessa semestralmente al MATTM;
- Quadro economico degli interventi;
- Scheda di monitoraggio sistema Caronte aggiornata;
- DPCM 1^aprile 2015 di nomina del Commissario dott.ssa Valeria Contraffatto;
- Provvedimento n.2 dell'8 settembre 2015 di insediamento del Commissario;
- Convenzione fra il Commissario e Sogesid sottoscritta il 25.11.2015;
- Convenzione sottoscritta fra il Commissario Unico e Invitalia il 12 ottobre 2017;
- Richiesta di proroga della Convenzione con Invitalia dell'8.5.2020;
- Comunicazione del RUP del 27 ottobre 2020 di aggiornamento del cronogramma.

Oltre alla documentazione ricevuta il Gruppo di lavoro ha inoltre esaminato la seguente documentazione trovata in rete:

- Deliberazione di giunta 43/2011 della Regione Siciliana – Procedure di Infrazione nei confronti della Regione siciliana da parte della Commissione Europea in materia ambientale. Determinazioni;
- Deliberazione di giunta 140/2011 della Regione Siciliana – Programmazione comparto idrico della Sicilia. Parziale modifica della DGR 43/2011 in ordine al coordinamento delle attività per far fronte alle procedure comunitarie di Infrazione 2007/2013 e 2009/2034;
- Deliberazione di giunta 200/2012 della Regione Siciliana – Modifiche al PAR FAS Sicilia 2007/2013;
- Deliberazione di giunta 22/2016 della Regione Siciliana – APQ rafforzato per l'attuazione sui sistemi fognari e depurativi idonei al superamento delle procedure comunitarie di Infrazione 2007/2013 e 2009/2034;
- Deliberazione di giunta 161/2013 della Regione Siciliana – APQ rafforzato per la depurazione delle acque reflue stipulato il 30 gennaio 2011 – Atto di indirizzo per il coordinamento e la collaborazione nella fase di attuazione degli interventi;
- Sentenza di Condanna della Corte di Giustizia Europea del 19 luglio 2012;
- Delibera CIPE 93/2015 - Regione Siciliana - Parziale riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2000-2006 e 2007-2013;
- Delibera CIPE 94/2015 - Regione Siciliana - Programma operativo complementare 2014-2020 - prima assegnazione di risorse;
- Delibera CIPE 52/2017 - Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014-2020
- 2014-2020 (reg. UE n. 1303/2013);
- Provvedimento n. 10 del 14.3.2016 del Commissario di nomina del RUP;
- Relazione sulle attività commissariali a novembre 2016;
- Provvedimento n. 1 del 26.6.2017 del Commissario Unico di conferma del RUP;
- Convenzione fra il Commissario Unico e Sogesid sottoscritta il 16.7.2018;
- Audizione del Commissario Straordinario Unico alla Commissione VIII Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, del 12 settembre 2018;
- Provvedimento n. 39 del 18.04.2018 del Commissario Unico di aggiudicazione definitiva della progettazione dei 5 lotti relativi all'estensione della rete fognaria;
- Provvedimento n. 103 del 18.04.2018 del Commissario Unico di nomina del DEC del Lotto 3 dell'intervento estensione della rete fognaria;
- Avviso di aggiudicazione di appalto INVITALIA per la procedura per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e servizi di indagini a

supporto della progettazione per l'intervento relativo al potenziamento dell'impianto di depurazione;

- Attività del Commissario Straordinario Unico. Focus Regione Sicilia. 4.2.2020 – Ing. Cecilia Corrao.

6. Condivisione degli esiti preliminari della verifica con i soggetti coinvolti

A seguito dell'analisi della documentazione e dell'intervista al RUP, è stato redatto un **Report preliminare** di verifica per una opportuna condivisione con i soggetti coinvolti.

Con nota n.13561 del 2 novembre 2020, il Report preliminare è stato trasmesso a:

- a. RUP – Ing. Cecilia Corrao
- b. Commissario straordinario Unico per la depurazione – Prof. Maurizio Giugni
- c. Regione Siciliana – Dipartimento Programmazione – Dott. Federico Iasco e Ing. Vittorio Perricone
- d. Regione Siciliana – Dipartimento Acqua e Rifiuti – Ing. Calocero Fori
- e. Regione Siciliana – Dipartimento Bilancio – Dott. Ignazio Tozzo
- f. NUVVIP – Dott. Domenico Spampinato

La citata nota di trasmissione specificava che *“in assenza di osservazioni in merito, da inviare entro il prossimo 20 novembre, il Report si intenderà condiviso e l'Agenzia potrà, tra l'altro, pubblicarne i contenuti sul proprio sito web”*.

Per le vie brevi sono state raccolte le osservazioni del Dirigente Generale del **Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana** e dell'Ing. Perricone, di cui si è tenuto conto nella presente stesura finale del Report.

Il 10 dicembre 2020, **il RUP ha proposto una serie di modifiche e integrazioni** che, dopo un confronto informale, sono state parzialmente accolte.



Agenzia per la Coesione Territoriale

NUVEC - Nucleo Verifica e Controllo – Area 1

Sostegno e accompagnamento per l'accelerazione di programmi e interventi della politica di coesione comunitaria e nazionale e verifica di efficacia

Al RUP dottor Marcello Loria
Servizio 1 - Servizio Idrico Integrato - Dissalazione e
sovrambito
Dipartimento Regionale acqua e rifiuti
Regione Siciliana
S01.dar@regione.sicilia.it
marcello.loria@regione.sicilia.it

e, p.c. Prof. Enrico Rolle
Commissario Straordinario Unico per la Depurazione
commissario@commissariounicodepurazione.it

Alla Regione Siciliana
Dipartimento del Bilancio e del Tesoro
Dott. Giovanni Bologna
ragionieregenerale@regione.sicilia.it

Dipartimento Programmazione – Area 5
U.O.B. A5.1 – Fondo Sviluppo e Coesione
area5programmazione@regione.sicilia.it

Al Referente del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica
degli Investimenti Pubblici della Regione Sicilia
Dott. Domenico Spampinato
domenico.spampinato@regione.sicilia.it

Alle Direzioni Generali dell'Agencia per la Coesione
Territoriale
vincenzo.gazzerro@agenziacoesione.gov.it
michele.dercole@agenziacoesione.gov.it

Al Coordinatore unico del NUVEC
Dott. Giampiero Marchesi
Giampiero.marchesi@agenziacoesione.gov.it

Oggetto: Programma attività di verifica sull'efficacia degli interventi finanziati con le risorse delle politiche di coesione – Progetto: Completamento depuratore consortile di Misterbianco ed estensione della rete, CUP G18F12000750007.

Luigi Guerci
Via Sicilia, 162c – 00187 Roma
tel. +39 06 96517667
nuvec.settore1@agenziacoesione.gov.it

MOD_08/2019

alct.ALCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0004391.01-04-2020



L'Agenzia per la coesione territoriale, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, ha avviato attraverso il Nucleo di Verifica e Controllo - NUVEC una linea di azione finalizzata alla verifica dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi attuati dalle politiche di coesione, come previsto peraltro nell'ambito del Piano Sud 2030 recentemente presentato dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale.

L'attività prevede lo svolgersi di sopralluoghi nelle aree di localizzazione degli interventi e/o presso le sedi dei beneficiari ma, a seguito della sopravvenuta situazione di emergenza sanitaria e delle disposizioni di cui ai DPCM del 9, 11 e 23 marzo 2020 e del DL 25 marzo 2020 n. 19, le attività, almeno per il momento, si svolgeranno prevalentemente da remoto.

La linea di azione non intende focalizzarsi sulla regolarità e l'ammissibilità della spesa né sovrapporsi alle attività di competenza degli organismi di controllo dei singoli programmi. La finalità è quella di esaminare lo stato di attuazione degli interventi ed evidenziare i risultati conseguiti promuovendo eventuali buone pratiche poste in essere, nonché individuare gli ostacoli che rallentano l'attuazione nel caso di progetti in corso o non avviati.

La selezione degli interventi pubblici oggetto di verifica (tre progetti per ciascuna Regione, di cui uno non avviato, uno in itinere e uno concluso) è stata effettuata tramite screening dalla Banca Dati Unitaria tramite Opencoesione privilegiando interventi ritenuti significativi e di rilevante dimensione finanziaria.

Tra questi, il progetto "Completamento depuratore consortile di Misterbianco ed estensione della rete", CUP G18F12000750007, finanziato dal Programma Regionale di Attuazione (PRA) FSC SICILIA 2007- 2013 per circa 205 milioni di euro, che dai dati presenti nel Sistema Nazionale di Monitoraggio risulta non avviato.

In attesa della possibilità di procedere ai sopralluoghi, si richiedono i documenti disponibili ritenuti utili per un'analisi preliminare dell'intervento (a titolo di esempio, relazione descrittiva, previsione nella programmazione triennale o nell'elenco annuale dei lavori pubblici, convenzione tra soggetto titolare delle risorse e beneficiario, atti di approvazione, relazione di avanzamento attuale, ecc.).

I referenti NUVEC per l'attività in oggetto sono la dr.ssa Cecilia Rosica (cecilia.rosica@agenziacoesione.gov.it) ed il dr. Luca Murrau (luca.murrau.esp@agenziacoesione.gov.it) che nei prossimi giorni prenderanno gli opportuni contatti per verificare disponibilità e modalità di acquisizione della documentazione e per concordare il prosieguo delle attività.

Si ringrazia per la disponibilità e per la collaborazione e si inviano i più cordiali saluti.

Il Coordinatore di Area

(Ing. Luigi Guerci)

2

Luigi Guerci
Via Sicilia, 162c – 00187 Roma
tel. +39 06 96517667
nuvec.settore1@agenziacoesione.gov.it

MOD_08/2019

Allegato 2.2 – Estratto Intervista alla struttura commissariale

Questioni approfondite: sintesi per punti

1. Ci può illustrare la nascita, la storia e le finalità dell'intervento, nonché il modello di governance adottato?

L'intervento, finanziato dalla Delibera CIPE n. 60/2012 nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro "Depurazione delle acque reflue", nasce con l'obiettivo garantire il soddisfacimento del fabbisogno fognario e depurativo dell'agglomerato consortile Misterbianco e di altri comuni etnei. Si tratta di opere auto-consistenti e integrate tra loro che concorrono al superamento delle Infrazioni Comunitaria in corso.

In particolare, la funzionalità del sistema fognario dell'intero agglomerato - che a regime sarà di circa 582 km suddivisi in 5 distretti - risulta attualmente pressoché nulla a causa dell'insufficiente grado di copertura fognario o della totale inesistenza nei centri abitati della mancanza della maggior parte dei collettori intercomunali per il convogliamento dei reflui all'impianto di depurazione, nonché della mancanza di allacci fognari delle utenze private nei tratti di rete esistente.

L'agglomerato di 11 Comuni interessa una popolazione complessiva di circa 158.000 abitanti residenti e circa 17.000 fluttuanti e solo circa 25.000 residenti risultano allacciati alla fognatura esistente e di questi solo una minima parte viene collettata all'impianto di depurazione esistente. Il Carico Generato dall'agglomerato, inclusa l'aliquota di Abitanti Equivalenti da attività produttive che recapitano in fognatura, è pari a circa 200.000 Abitanti Equivalenti.

La struttura commissariale - il cui mandato è di garantire il superamento della procedura d'infrazione - ha modificato l'assetto dell'intervento, separandolo in due componenti: 1) estensione della rete fognaria e 2) potenziamento dell'impianto di depurazione. Tale separazione viene disciplinata nel "Documento di Programmazione Generale", approvato dal Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/14, con Provvedimento n. 13 del 4 aprile 2016.

Sotto il profilo della governance, attualmente, il Commissario Straordinario Unico per la depurazione si avvale – attraverso convenzioni – di SOGESID, per il supporto tecnico-amministrativo, e di INVITALIA quale Centrale di Committenza. I costi delle strutture sono imputati ai quadri economici degli interventi.

2. Il progetto preliminare elaborato dal Comune di Misterbianco è stato oggetto di rimodulazione coerentemente con le indicazioni del MATTM. Questo aspetto è stato indicato come una criticità. Sotto quali aspetti sono intervenute modifiche rispetto alla progettazione preliminare originaria?

Nel 2015 l'intervento è stato commissariato perché non aveva rispettato i tempi per l'OGV e perché il soggetto attuatore (Comune di Misterbianco) aveva previsto un appalto integrato con riferimento alla parte di intervento (preponderante) relativa alle opere fognarie e di collettamento: per tale tipologia il MATTM ha ritenuto improprio (se non illegittimo) il ricorso ad un appalto del tipo di quello ipotizzato.

Per tale motivo la struttura commissariale ha operato una rimodulazione del progetto, per renderlo coerente con le indicazioni e prescrizioni dettate dall'UTS del MATTM. In particolare, è stato definito con esattezza il quadro della domanda di infrastrutturazione collegandola alle reali condizioni urbanistiche che definiscono formalmente l'appartenenza all'agglomerato degli 11 Comuni.

La nuova versione del progetto è contenuta nel "Documento di Programmazione Generale dell'intervento" (DdPG) che è stato approvato dalla stessa UTS, in data 16 dicembre 2015, e sottoposto alla Conferenza di Servizi Preliminare ex art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il 4 marzo 2016, nel corso della quale i Soggetti convocati hanno espresso positivamente le proprie valutazioni preliminari. Ad esito dei lavori della Conferenza dei Servizi, il Commissario Straordinario ex art.7, comma7, del D.L.133/14, con Provvedimento n. 13 del 04/04/2016

3. Ai sensi del Documento di Progettazione Generale (DPG) predisposto dalla struttura commissariale l'intervento "Completamento depuratore consortile di Misterbianco ed estensione della rete fognaria" è attuato mediante due distinti procedimenti: a) "Estensione della rete fognaria dei comuni di Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania (quartiere San Giovanni Galermo), Gravina di Catania,

Mascalucia, Misterbianco, Nicolosi, Pedara, San Pietro Clarenza, Trecastagni, Tremestieri Etneo e collettori di adduzione all'impianto consortile di trattamento di Misterbianco che per complessità e lunghezza della rete è stato suddiviso in 5 distretti; b) ***"Potenziamento dell'impianto di trattamento consortile di Misterbianco e sistemazione dell'area"*** che prevede la riconversione dei manufatti e delle strutture impiantistiche esistenti e la realizzazione delle nuove unità necessarie, adottando per il comparto biologico una tecnologia a membrana.

In relazione allo stato di attuazione dei due interventi:

- **Per l'intervento a) il 4 agosto 2016 è stato pubblicato il bando per l'affidamento dei servizi di ingegneria suddiviso in 5 lotti, per un importo complessivo di 4.953.748,15 euro e i contratti con gli aggiudicatari si sono perfezionati a gennaio 2019, quasi due anni e mezzo dopo la pubblicazione della gara. In particolare, perché è passato più di un anno per la nomina della commissione di valutazione delle offerte (intervenuta il 16 ottobre 2017) dalla scadenza per la presentazione delle proposte (intervenuta il 20 settembre 2016)?**

La gara dei servizi di progettazione della rete fognaria non è stata seguita da INVITALIA perché in un primo momento SOGESID si occupava anche delle gare.

Il ritardo della nomina della Commissione di valutazione è imputabile al cambio del Commissario intervenuto in quel periodo.

- **Inoltre, la durata del percorso di verifica dei requisiti di oltre 5 mesi - dal 18.4.2018 all'1.10 2018 - da cosa è dipesa, esattamente?**

La durata del percorso di verifica dei requisiti è imputabile alla complessità dei progetti e alla numerosità dei soggetti che componevano le RTI.

- **Sempre per l'intervento a) la progettazione definitiva è andata in conferenza di servizi il 1^a aprile 2020: la conferenza di servizi ha espresso prescrizioni? Gli interventi sono soggetti a vincoli? I pareri autorizzativi necessari quali ambiti coinvolgono? Alla luce della data della conferenza di servizi è congruo l'inizio lavori per la rete fognaria previsto per il 1^a agosto 2020? Sono pronti gli atti di gara? La gara sarà esperita da INVITALIA?**

I progetti definitivi sono stati consegnati a fine 2019, con un certo ritardo, per una serie di difficoltà e modifiche dovute al piano delle indagini e alla necessità di approvare alcune perizie di variante. Inoltre, i tempi dilatati sono soprattutto imputabili alla fase diagnostica, che implica la necessità di dover richiedere autorizzazioni a diversi soggetti competenti.

All'esito della Conferenza dei servizi (la cui conclusione è prevista per agosto) si prevede di predisporre il progetto esecutivo entro il mese di settembre.

Si segnala che la rete fognaria non è soggetta alla Valutazione di Impatto Ambientale in quanto le opere fognarie intervengono solo su strade poco urbanizzate e non incidono su aree protette o sottoposte a vincoli di natura ambientale e paesaggistica.

Ad esito della redazione del progetto esecutivo si procederà alla verifica ex art. 26, comma 6, lett.a, del D.Lgs 50/16 a cura di un soggetto già individuato ad esito di una procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro ex art. 54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento ad unico operatore dei servizi di verifica di progetti di importo lavori pari o superiore a venti milioni di Euro, avviata con determina a contrarre Provvedimento n. 47 del 4 giugno 2019 del Commissario Straordinario Unico. L'appalto è stato diviso in 4 lotti: il Lotto 1 è relativo al presente intervento.

Si auspica di poter procedere alla validazione, a cura del RUP, e alla successiva approvazione del Commissario Straordinario Unico entro dicembre p.v.

Si prevede che a gennaio 2021 i progetti esecutivi saranno inviati alla centrale di committenza INVITALIA che bandirà la gara (in lotti); l'aggiudicazione è prevista entro un anno dall'avvio della procedura di gara e i lavori pertanto si avvieranno almeno con un anno di ritardo rispetto a quanto indicato nella relazione trasmessa.

- **Qual è il valore complessivo dei lavori sui 5 distretti che verrà messo a bando? È possibile avere i quadri economici? La copertura finanziaria è disponibile? Qual è il quadro dei fabbisogni generale dell'APQ?**

Sul totale dei previsti 204 meuro previsti per l'intero progetto, attualmente i due interventi quotano 325 meuro, di cui 35 meuro per il depuratore e 290 meuro per la rete fognaria. Il Commissario Rolfe aveva già evidenziato una criticità finanziaria, di circa 25 meuro, per questo intervento che ora si è ulteriormente incrementata fino ad arrivare a 120 meuro. La copertura sarà recuperata nell'ambito dell'APQ.

Rispetto all'APQ la struttura commissariale dispone di un quadro riepilogativo delle risorse attualmente disponibili: risulta in particolare una dotazione di circa di 170 meuro, di cui 120 meuro imputabili all'intervento in oggetto.

- **Anche per l'intervento 2) il 4 agosto 2016 è stato pubblicato il bando per l'affidamento di una serie di indagini e rilievi per verificare lo stato di consistenza del depuratore, per un importo complessivo di 60.918,64 euro; i tempi fino alla firma del contratto (intervenuta il 15 maggio 2018) sono stati più brevi ma ha pesato sempre il ritardo della nomina della commissione. Sulla base dei rilievi e delle indagini effettuate, INVITALIA il 5 agosto 2019 ha bandito la gara per i servizi di ingegneria, aggiudicata a febbraio 2020. Al momento, INVITALIA sta predisponendo la documentazione contrattuale. È congrua la data di inizio lavori indicata per l'impianto di depurazione prevista per il 30 gennaio 2022?**

La consegna della progettazione definitiva è prevista per fine 2020; considerando almeno tre/sei mesi per la procedura di VIA (necessaria in questo caso trattandosi di un depuratore con una quota di Abitanti Equivalenti (AE) superiore a 100 mila abitanti) e per la verifica di ottemperanza a giugno 2021 si potrebbe chiudere la Conferenza di servizi e INVITALIA potrebbe pubblicare l'appalto integrato successivamente all'avvenuta verifica ex art. 26 del D.L 50/16, validazione del RUP e approvazione del CSU. A settembre 2021 potrebbe essere bandita la gara per appalto integrato che, sulla base dei tempi di esperimento delle altre procedure di gara, si stima di aggiudicare entro un anno. Successivamente all'aggiudicazione si procederà alla redazione del progetto esecutivo a cura dell'Appaltatore e alla successiva verifica ex art. 26 del D.L 50/16, approvazione in linea tecnica del RUP e amministrativa del CSU. Sulla base dei tempi medi registrati da questa Stazione Appaltante per l'ottenimento dei pareri ambientali e dell'onerosità delle attività di verifica, si stima di poter avviare i lavori entro la fine del 2022.

L'attività di verifica è già stata affidata al medesimo soggetto già individuato ad esito della procedura di gara aperta avviata con determina a contrarre Provvedimento n. 47 del 4 giugno 2019 del Commissario Straordinario Unico, affidatario del Lotto 1.

Si segnala infine che nel sito dell'impianto insiste una frana che ha demolito alcuni locali di servizio della linea fanghi e che l'intervento prevede anche un intervento di consolidamento del versante.

- **Nella documentazione acquisita si fa riferimento ad una ulteriore procedura - di recente aggiudicata - per la progettazione degli interventi per l'adeguamento dell'impianto di depurazione di contrada Cubba. A quale dei due interventi del DdPG è ascrivibile?**

Il progetto è ascrivibile al procedimento individuato nel DdPG "Potenziamento dell'impianto di trattamento consortile di Misterbianco e sistemazione dell'area".

4. **Sotto il profilo del monitoraggio, la struttura commissariale alimenta direttamente Caronte con funzioni di Responsabile Esterno dell'Operazione (REO)? I dati sono aggiornati? È possibile acquisire l'ultima scheda operazione?**

Al momento gli interventi della Delibera CIPE 60/2012 sono in corso di razionalizzazione sul sistema Caronte. Il RUP interviene solo sulla parte relativa alla rendicontazione contabile e all'aggiornamento dell'avanzamento procedurale. Le richieste di rimodulazione sono state invece trasmesse al Commissario che è deputato a interloquire con l'amministrazione regionale. La scheda dell'operazione in oggetto è aggiornata e sarà trasmessa.

5. Emerge dalla documentazione acquisita che le opere - una volta concluse - saranno consegnate all'A.T.O. Catania 2 che non ha ancora individuato il soggetto gestore unico d'ambito. Sono previste azioni che garantiscano la sostenibilità degli interventi nel medio-lungo termine?

Ogni comune (sono 11 attorno a Misterbianco) ha singoli gestori. Al momento, l'ATO Catania 2 ha avviato il percorso per l'individuazione del soggetto gestore unico.

Al momento non sono garantite le risorse e le modalità per gli allacci della rete e ciò costituisce un problema di sistema, che potrebbe essere risolto inserendo nel Quadro economico i costi per gli allacci a carico dei singoli gestori territoriali.

Il Commissario, avendo la competenza per superare la procedura di infrazione, si sta facendo parte attiva dando indicazioni operative per gli allacci.

Partecipanti alla riunione del 17 giugno 2020

Partecipanti per la struttura commissariale

- Ing. Cecilia Corrao (RUP)
- Ing. Giuseppe Iannazzo (DEC Lotti 1 e 3)
- Ing. Francesco Morga (DEC Lotto 2 rete fognaria)
- Ing. Gaspare Di Salvo (DEC Lotto 5)
- Ing. Valentina Parco (DEC depuratore in attesa di nomina)

Partecipanti per il NUVEC

- Ing. Luigi Guerri – Responsabile Area 1
- Dott.ssa Cecilia Rosica – Componente NUVEC
- Dott.ssa Federica Tarducci – Componente NUVEC
- Dott.ssa Francesca Ubertini – Componente NUVEC
- Dott. Luca Murrau – Esperto
- Dott. Patrizio Resta – Esperto

Partecipanti per l'ACT

- Dott. Federico Lasco – Ufficio III – APP
